


OZNAČENÍ P5-2\_01\_W Musílkova 302/1, 150 00 Praha 5 – Košiče

BJ č. 302/16, 3. patro

DISPOZICE BYTU 2+KK

ZAMĚŘENÍ – SCHÉMA

Š.V. = 2,92 – 3,14 m

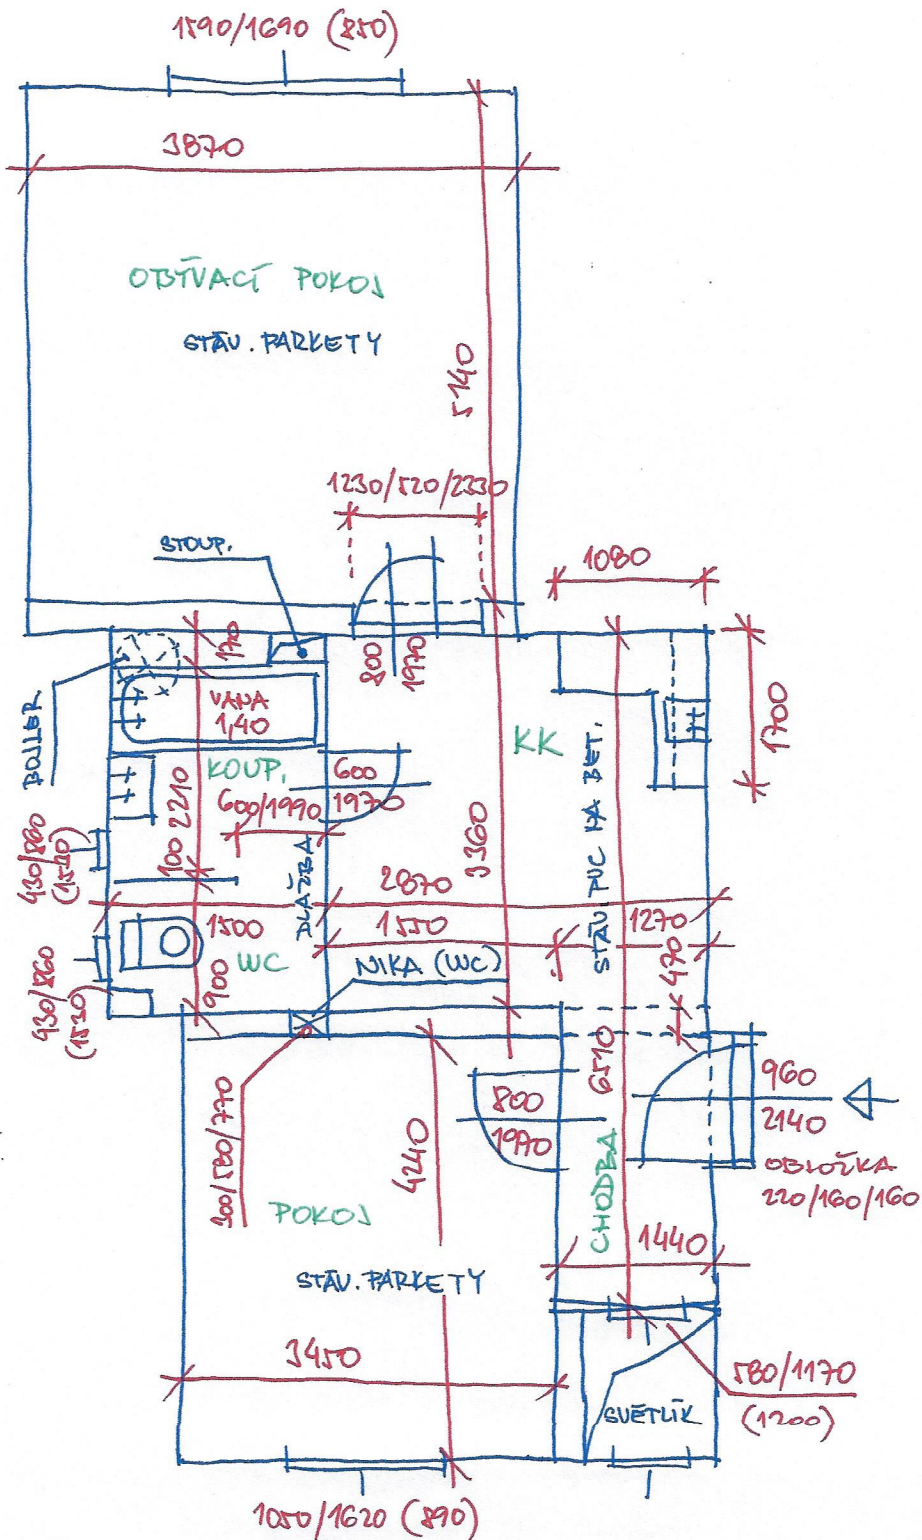



# DŮM V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM ŮZEMÍ (DLE KN)

## Protokol o prohlídce volného bytu

číslo PF-2/01/W

Ulice	Číslo popisné/ orientační	patro:	byt.č.	dispozice	výměra:	Datum prohlídky
MUSÍTKOVA	302/1	3	302/16	2+kk	DCE W	14/02/21

### Účastníci

Jméno	Firma	Podpis
WIESNER	WIESNER	

### Soupis plánovaných prací

Výměna vstupních dveří požárních (vč. kování, kukátka, prahu), výliff zárubně betonem	<del>ANO</del>	NE ✓
Vyliff zárubně betonem <b>! KOMPZ. REPARACE VSTUP. SVĚTL. ! + ZÁRUBNĚ</b>	<del>ANO</del>	NE ✓
Nové vnitřní dveře	Plně	1 ks
		2/3 sklo
		2 ks
		2x
		2x
		—
		2x
Kompletní výměna elektroinstalace vč. revize elektro	<del>ANO</del>	NE ✓
Sjednocení zásuvek a vypínačů, instalace povinných svíidel	ANO ✓	NE ✓
Výměna domácího telefonu	<del>ANO</del>	NE ✓
Vyzdění instalačního jádra vč. vyzdění přičky s revizními dvířky 30x30 cm na WC u stoupaček	<del>ANO</del>	NE ✓
Nové obklady	ANO	
Dlažba na koso	<del>ANO/NE</del>	Dlažba rovnoběžně
		ANO/NE
Nové zařizovací předměty		
Vana	<b>! VANA DL. 1,90 M !</b>	ANO ✓
		NE ✓
Snížená vanička se zástěnou		ANO ✓
		NE ✓
Umyvadlo		ANO ✓
		NE ✓
WC vč. sedátka		ANO ✓
		NE ✓
Baňe		ANO ✓
		NE ✓
Sifony		ANO ✓
		NE ✓
Napojení na pračku		ANO ✓
		NE ✓
Koupelnová skříňka		ANO ✓
		NE ✓
Nová elektroinstalace v jádru vč. elektro revize	<del>ANO</del>	NE ✓
Výměna odvětrání elektrickými ventilátory	<del>ANO</del>	NE ✓
	<b>(STAV. OKNA DO SVĚTLU)</b>	
Výměna PVC	Odstranění a likvidace starého PVC	ANO ✓
	Vyrovnání podkladu	ANO ✓
	Položení nového PVC	ANO ✓
		NE ✓
Výměna plovoucí podlahy	Odstranění a likvidace staré plovoucí podlahy	<del>ANO</del>
	Vyrovnání podkladu	<del>ANO</del>
	Položení nové plovoucí podlahy	<del>ANO</del>
		NE ✓
Likvidace vestavěných skříní		
	Předsíň	
	Pokoje	
	Kuchyně	
Nové výmalby	ANO	
	Stržení tapet	
		%



STROPT

100%

Úprava podkladu stěn		100	%
Nátěr zárubní		3	ks
Nátěr radiátorů		/	ks
Nátěr topenářských rozvodů		/	mb
Likvidace garnýží		/	ks
Montáž nových garnýží		2	ks
Likvidace staré kuchyňské linky	BEZ LINKY		<del>ANO</del> NE ✓
! PLYNOVÝ SPORÁK	Výměna sporáku	ANO ✓	<del>NE</del>
	Sklokeramika	<del>ANO</del>	NE ✓
	Dvouplotýnkový vařič	<del>ANO</del>	NE ✓
	Montáž kuchyňské linky	ANO ✓	NE
	Dřez	ANO ✓	NE
	Baterie	ANO ✓	NE
	Sífon	ANO ✓	NE
	Osvětlení	ANO ✓	NE
	Odvětrání	BEZ DICESTORU, NENÍ VST	<del>ANO</del> NE ✓
	Připojení pro myčku	ANO ✓	NE
	Obklad za linku	ANO ✓	<del>NE</del>
Výměna ventilátoru v kuchyni		<del>ANO</del>	NE ✓
Kuchyňská linka je v provedení pro invalidy		<del>ANO</del>	NE ✓
Instalace termovintilů	/	ks	<del>ANO</del> NE ✓
Seřízení oken	10	ks	ANO ✓ <del>NE</del>
Demontáž předokeních žaluzií	/	ks	<del>ANO</del> NE ✓
Zatmelení oken			<del>ANO</del> NE ✓
Demontáž SDK příčky	/	m2	<del>ANO</del> NE ✓
Demontáž dlažby a položení nové	Předstř		ANO <del>NE</del> ✓
	Kuchyň		<del>ANO</del> NE ✓
	WC + koup.		ANO ✓ <del>NE</del>
	Balkón		<del>ANO</del> NE ✓
Nátěr kovových konstrukcí balkónu			<del>ANO</del> NE ✓

Poznámky BEZ PLYNOMĚRU A ELEKTROMĚRU

! - VÝMĚNA 2x TOPIDLO PLYNOVÉ WAF, ÚČ. ÚPRAV OPOTAVU, NOVÝ BÍTBOV	!
POWOD POTTWIBI PLYNU ÚČ. PŘÍVODU PRO PLYN. SPORÁK + REVIZE	
- 1x koup. odlo - omdba	
- kompl. repase usuv. duedi oblozk. zárušne, d+M kouvan	
- NETĚSNÍ HL. UZAVĚR VODY U VOPOMĚRU	
- d+M EL. BOJLERU - 120 LITRŮ	
- PODAVA OMDBA A KK - ÚPRAV. MAZANINA Ø 72.60 MM	
- POKOJE - REPASE A OPRAVA STAV. PARKET	
- LOK. TRUMNY PRÁSKUNY, LOKALNÍ ÚČET PUSNÍ	
- REPASE A OPRAVU OKEN ÚČ. OKEN DO SVĚTLIKU	

- kompl. nové powody 2x

- souviselící probné zámeč. oprav a úpravy (zárušne, panty)

- poukna sůtřia die W

- kontrola sta, příp. internetu
