MĚŘICKÝ NÁČRT Č.
BEZ MĚŘÍTKA

PRAHA 5 SÍDLIŠTĚ HOMOLKA

ZAJIŠTĚNÍ KANALISACE A KABELOVÉHO KANÁLU

KONTROLNÍ ZÁPIS Č.



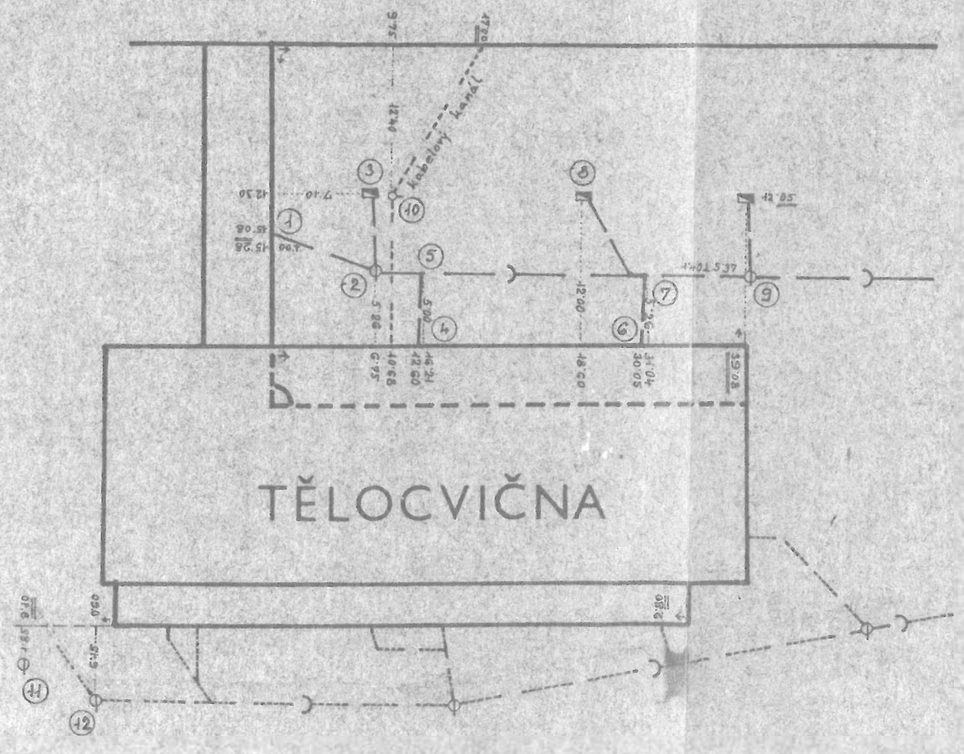

Bod	Výška	Poznámka
1	279,04	vrch roury
2	78,67	dno žlábku
3	79,12	dno
4	78,94	vrch roury
5	78,22	— " —
6	78,41	— " —
7	77,22	— " —
8	78,32	dno
9	75,98	dno žlábku
10	78,80	kabely v šachtě
11	79,75	dno žlábku
12	278,66	dno žlábku
13		
14		

POZEMNÍ STAVBY, národní podnik PRAHA
oprávněn geometr

Podle vyjádření stavbyvedoucího je jižní část kanalisace provedena podle projektu.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ

ZAMĚŘIL: ONE 25.I.78 Ing. Paul, Ing. Mosler, 16.VIII.78 Ing. Paul, J. Rož.
VYPRACOVAL: Ing. Paul
