



č.0079/3/OMI/17

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0079/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** RAVION s.r.o.  
se sídlem: Toužimská 588/70, PSČ 197 00, Praha 9 - Kbely  
zastoupená: Janem Steinem, jednatelem  
IČ: 289 90 242  
DIČ: CZ 289 90 242  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: ██████████  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

#### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ a MŠ Barrandov I., objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy – sociální zázemí pro sportovní areál“ ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 13. 03. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2018 (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 11.855.275,63,- Kč bez DPH, tj. 14.344.883,51,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 3 (dále také jako „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu díla a z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. Tyto stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

### 3. Předmět dodatku

3.1. S odkazem na čl. 6 odst. 6.7.4. a 6.7.5. a čl. 12 odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jímž se upravuje rozsah stavebních prací o položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 a tomu odpovídající navýšení ceny a prodloužení termínu předání díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 10. následujícího znění:

*„10. Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 6)*

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Vše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 až č. 4, dokumenty pod bodem 5 a 6 této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 7 a č. 8 a dokumenty pod bodem 7, 8 a 9 této smlouvy tvoří přílohy č. 9, č. 10 a č. 11 a také dokument pod bodem 10 této smlouvy tvoří přílohu č. 12 a je také její nedílnou součástí.“*

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se bod 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5.1.2.*

*Předání díla nejpozději do 30. 9. 2018, vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání (Kolaudační souhlas). Provedení vjezdové brány do 9 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3.“*

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1.*

*Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

12.227.421,72,- Kč	bez DPH
2.567.758,56,- Kč	21% DPH
14.795.180,28,- Kč	včetně DPH

*(slovy: dvanáctmilionůdvěstědvacetšedmtisícčtyřístadvacetjedna korun českých a sedmdesátka haléřů bez DPH)*

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.2.*

*Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 11.9. 2017, ze dne 08. 02. 2018 a ze dne 18. 5. 2018 a také ze dne 26.7.2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“*

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 12 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

*„Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracována firmou Ing. Ivaň Štěr, projektování dopravních staveb CZ s.r.o*

*Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem*

*Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo*

*Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem – aktualizovaný*

*Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů*

*Příloha č. 6: Přehled osob – realizační tým*

*Příloha č. 7: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 1)*

*Příloha č. 8: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 2)*

*Příloha č. 9: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 3)*

*Příloha č. 10: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 4)*

*Příloha č. 11: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 5)*

*Příloha č. 12: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 6)*

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 3 Smlouvy.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Příloha č. 1, které zároveň tvoří novou přílohu č. 12 Smlouvy – Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 6).
- 4.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

č.0079/3/OMI/17

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 34/1084/2018 ze dne 22.8.2018.

29-08-2018

V Praze dne .....



za objednatele:

Městská část Praha 5  
Ing. Pavel Richter, starosta



28/8/2018

V Praze dne .....



za zhotovitele:

RAVION s.r.o.  
Jan Stein, jednatel



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>06/2018</b>
<b>ze dne: 18.07.2018</b>		
projekt:	<b>ZŠ a MŠ Barrandov I., sociální zázemí pro sportovní areál</b>	
místo:	Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy	




Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s SoD tuto změnu rozsahu výše uvedeného díla.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z požadavku investora vyplynuly níže uvedené úpravy:

I. osazení svítidla s pohybovým čidlem na stěnu šaten,	7 717,50 Kč
II. uzavření prostoru mezi šatnami a školou - oplocení, vč. branky,	12 015,03 Kč
III. odstranění stávajících lavíček, vč. bet základu, + zřízení záhonu u vzrostlé borovice,	56 534,34 Kč
IV. realizace nové vjezdové brány, vč. dvou branek,	197 591,34 Kč
V. XPS G tl.180mm - doplnění materiálu, + příklady a ovládání pro 3ks vyhřívaných střešních vpustí - doplnění položky,	48 150,10 Kč
VI. okapový chodník + omyvatelná malba v m.č. 101 a 102.	50 137,78 Kč
	<u>372 146,09 Kč</u>

Přikládáme cenovou nabídku na realizaci tohoto řešení.

Počet připojených listů:	12	Počet připojených výkresů:	1
Cena méněprací bez DPH:	<b>-3 307,52 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:	<b>375 453,61 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	<b>372 146,09 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	 
Datum:		Datum:	

Změnový list vystavil: Jan Stein

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy I.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**  
 Praha 9 Kbely  
 197 00 Toužimská 588/70

IČO: **289 90 242**  
 DIČ: **CZ28990242**

Objednatel:

IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	7 492,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	225,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	7 717,50 CZK
--------------------------	------	--------------

Základní DPH	21 %	1 621,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení:	0,50 CZK
---------------	----------

**Cena celkem: 9 339,00 CZK**

**RAVION** s.r.o.

IČO: 289 90 242 DIČ: CZ28990242  
 Toužimská 588/70 Praha 9 Kbely  
 197 00



Za zhotovitele



Za objednatele

v PRAZE

dne 26.07.2018

Popis: I. Osazení svítidla s pohybovým čidlem na stěnu šaten



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	225,00	0,00000
E	ELEKTRO	HSV	7 492,50	0,00931
<b>Celkem:</b>			<b>7 717,50</b>	<b>0,00931</b>

*1. 1. 2014*

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>225,00</b>
1 1	Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%		1,000	225,00	225,00
<b>Díl: E ELEKTRO</b>					<b>7 492,50</b>
2 pol.1	Jistič - dodávka	kus	1,000	245,00	245,00
3 pol.2	CYKY J3x2,5, dodávka	m	28,500	35,00	997,50
4 pol.3	Svítilko LED, dodávka	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
5 pol.4	Montáž, vč. podružného materiálu	kus	1,000	950,00	950,00
6 pol.5	Pohybový senzor typ RC-plus next 230 IP54	kus	1,000	2 350,00	2 350,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy II.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**  
Praha 9 Kbely  
197 00 Toužimská 588/70

IČO: **289 90 242**  
DIČ: **CZ28990242**

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	11 665,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	350,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	12 015,03 CZK
Základní DPH	21 %	2 523,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,03 CZK

**Cena celkem: 14 538,00 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

V

dne 26.07.2018

Popis: II. Uzavření prostoru mezi šatnami a školou - oplocení pletivem + branka

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	276,03	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	699,00	0,75750
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 690,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	350,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>12 015,03</b>	<b>0,75750</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>276,03</b>
1	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	0,300	890,00	267,00
2	162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	0,300	30,10	9,03
<b>Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání</b>					<b>699,00</b>
3	275 31-3611.R00 Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,300	2 330,00	699,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>10 690,00</b>
4	pol. 1 Montáž a dodávka sloupků, osazení el., Zn	ks	5,000	465,00	2 325,00
5	pol. 2 Montáž a dodávka oplocení z pletiva Zn	m	2,000	520,00	1 040,00
6	pol. 3 D+M - branka, FAB, výplň pletivo Zn	ks	1,000	7 325,00	7 325,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>350,00</b>
7	1 Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%	-	1,000	350,00	350,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy III.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**  
Praha 9 Kbely  
197 00 Toužimská 588/70

IČO: 289 90 242  
DIČ: CZ28990242

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	54 874,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 660,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	56 534,34 CZK
Základní DPH	21 %	11 872,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,34 CZK

**Cena celkem: 68 406,00 CZK**

**RAVION**

IČ: 289 90 242 DIČ: CZ28990242

Tel: +420 225 11 12 22

www.ravion.cz

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
za objednatele

V \_\_\_\_\_

dne 26.07.2018 \_\_\_\_\_

Popis: **III. - odstranění stávajících laviček + zřízení záhonu u vzrostlé borovice**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 186,94	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	-470,00	-0,00304
13	Hloubené vykopávky	HSV	1 732,89	0,00000
27	Základy	HSV	6 258,71	7,02100
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	39 545,00	4,93348
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	6 620,80	0,02878
VN	Vedlejší náklady	VN	1 660,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>56 534,34</b>	<b>11,98022</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 186,94</b>
1	162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,820	204,00	575,28
2	162 70-1109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,100	15,50	218,55
3	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky	m3	2,820	13,40	37,79
4	171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, skládkovné	m3	2,820	126,00	355,32
<b>Díl: 11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-470,00</b>
5	112 014 Kácení stromů D kmene do 0,5m s odstraněním pazu, odvoz do 5km	kus	-1,000	470,00	-470,00
<b>Díl: 13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 732,89</b>
6	132 20-1110.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	2,820	428,50	1 208,37
7	132 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,820	186,00	524,52
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>				<b>6 258,71</b>
8	274 31-3611 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,650	2 300,00	6 095,00
9	271 53-2212 Podsyp pod základové konstrukce 16-32mm, se zhuňněním	m3	0,170	963,00	163,71
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>39 545,00</b>
10	pol. 1 Zdivo lícové z cihel betonových spárované, cihly betonové, kruhový záhon	m3	2,200	17 975,00	39 545,00
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>6 620,80</b>
11	966 168 Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem, do 20km	m3	1,600	3 780,00	6 048,00
12	014 111 Poplatky za skládku typ S-IO (inertní odpad)	m3	1,600	358,00	572,80
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 660,00</b>
13	1 Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%	-	1,000	1 660,00	1 660,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy IV.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**  
Praha 9 Kbely  
197 00 Toužimská 588/70

IČO: **289 90 242**  
DIČ: **CZ28990242**

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	48 986,34
PSV	142 850,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 755,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	197 591,34 CZK
Základní DPH	21 %	41 494,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,34 CZK

**Cena celkem: 239 085,00 CZK**

**RAVION**

IČ: 289 90 242 DIČ: CZ28990242  
Toužimská 588/70 197 00 Praha 9 Kbely  
e-mail: info@ravion.cz tel: 224 224 224

Za zhotovitele

Za objednatele

V \_\_\_\_\_

dne 26.07.2018


Popis: **IV. realizace nové pojezdové brány, vč. dvou branek**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 037,52	0,00000
13	Hloubené vykopávky	HSV	1 106,10	0,00000
27	Základy	HSV	3 877,42	4,40524
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	19 090,70	0,00776
767	Konstrukce zámečnické	PSV	142 850,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	5 755,00	0,00000
E	ELEKTRO	HSV	23 874,60	2,52168
<b>Celkem:</b>			<b>197 591,34</b>	<b>6,93468</b>



Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 037,52</b>	
1	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,465	204,00	502,86
2	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,325	15,50	191,04
3	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,465	13,40	33,03
4	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, skládkovné	m3	2,465	126,00	310,59
<b>Díl: 13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 106,10</b>	
5	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	1,800	428,50	771,30
6	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,800	186,00	334,80
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>				<b>3 877,42</b>	
7	274 31-3611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,600	2 300,00	3 680,00
8	271 53-2212	Podsyp pod základové konstrukce 16-32 mm, se zhutněním	m3	0,205	963,00	197,42
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>19 090,70</b>	
9	966 168	Bourání konstrukcí, ze železobetonu s odvozem, do 20km	m3	2,650	3 780,00	10 017,00
10	014 111	Poplatky za skládku typ S-IO (inertní odpad)	m3	2,650	358,00	948,70
11	966 170	Bourání a likvidace původní brány a branky	kpl	1,000	8 125,00	8 125,00
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>142 850,00</b>	
12	767 000	Vjezdová vrata + dvě branky, příloha - nákres	kompl	1,000	142 850,00	142 850,00
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 755,00</b>	
13	1	Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%	-	1,000	5 755,00	5 755,00
<b>Díl: E</b>	<b>ELEKTRO</b>				<b>23 874,60</b>	
14	pol. 1	Přívod elektro - CYKY 5x2,5 + 3x1,5	m	55,000	65,00	3 575,00
15	pol. 2	Chráníčka 40mm korugovaná	m	65,000	39,00	2 535,00
16	pol. 3	Jistič - dodávka	ks	1,000	245,00	245,00
17	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	38,000	225,50	8 569,00
18	460 42-0021.R00	Zřízení kab.lože v rýze z písku 5 cm	m	38,000	39,80	1 512,40
19	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	38,000	9,90	376,20
20	460 57-0163.R00	Zához rýhy 35/75 cm, homina třídy 3, se zhutněním	m	38,000	49,00	1 862,00
21	pol. 4	Montáž elektro	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00

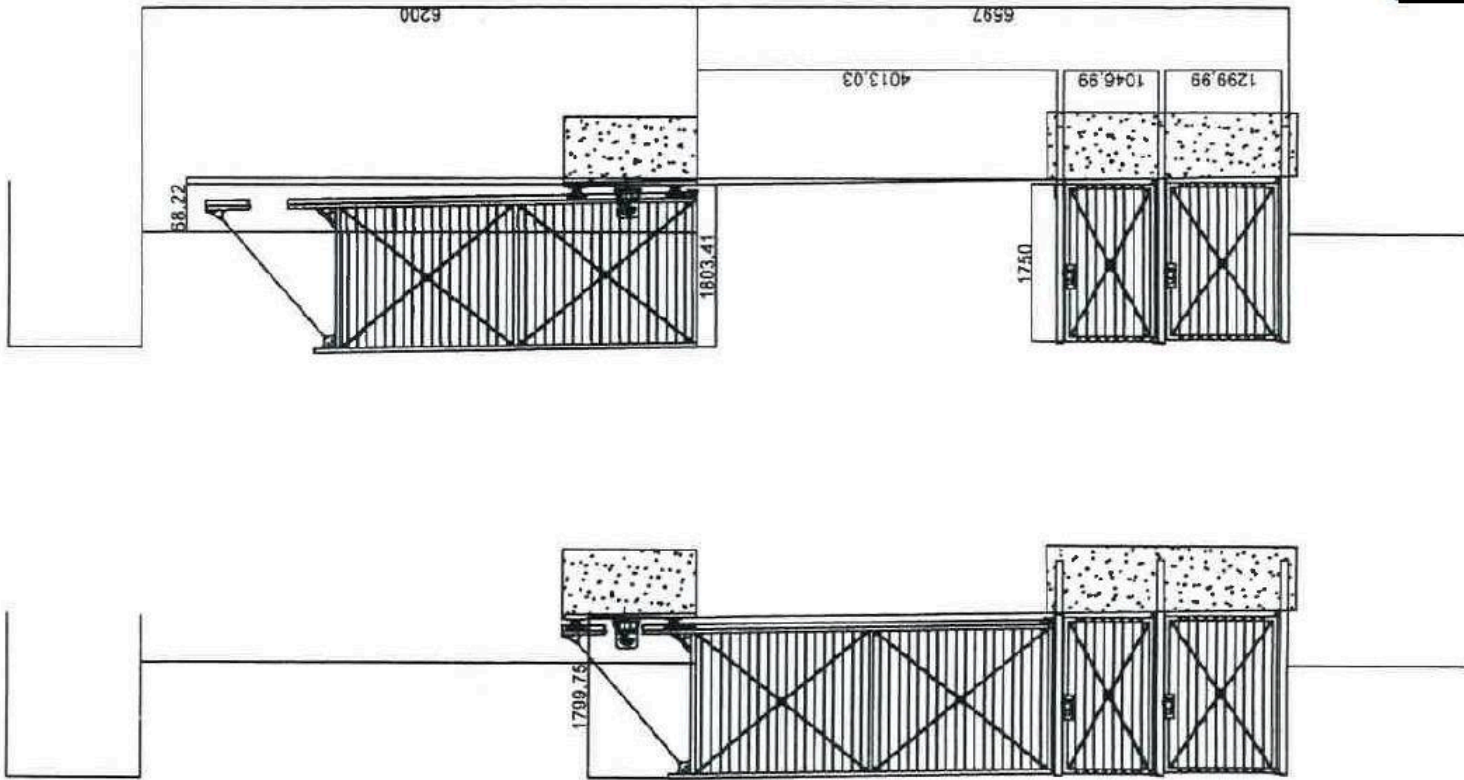

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy V.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.**  
**Praha 9 Kbely**  
**197 00 Toužimská 588/70**

IČO: **289 90 242**  
DIČ: **CZ28990242**

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	11 343,00
PSV	35 405,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 402,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	48 150,10 CZK
Základní DPH	21 %	10 112,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,10 CZK

**Cena celkem: 58 262,00 CZK**

**RAVION**

IČO: 289 90 242 DIČ: CZ28990242  
Toužimská 588/70 197 00 Kbely  
www.ravion.cz 2

Za zhotovitele

v PRAZE

dne 26.07.2018

Popis: **V. ELEKTRO - přívody a ovládání pro 3ks vyhřívaných střešních vpustí; doplnění materiálů**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
713	Izolace tepelné	PSV	35 405,10	0,26649
VN	Vedlejší náklady	VN	1 402,00	0,00000
E	ELEKTRO	HSV	11 343,00	0,01390
<b>Celkem:</b>			<b>48 150,10</b>	<b>0,28039</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>					<b>35 405,10</b>
1	283-76421- Deska polystyrenová XPS 300 180mm	m2	42,300	837,00	35 405,10
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>1 402,00</b>
2	1 Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%	-	1,000	1 402,00	1 402,00
<b>Díl: E ELEKTRO</b>					<b>11 343,00</b>
3	pol.1 CYKY J3x2,5 - dodávka	m	54,000	35,00	1 890,00
4	pol.2 Jistič + stykač - dodávka	kus	1,000	680,00	680,00
5	pol.3 Teplotní čidlo, vč. regulace, dodávka	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
6	pol.4 Montáž, vč. podružného materiálu	kus	1,000	3 923,00	3 923,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Sociální zázemí pro sportovní areál - ZL 06 - venkovní úpravy VI.**

Zhotovitel: **RAVION s.r.o.** IČO: **289 90 242**  
**Praha 9 Kbely** DIČ: **CZ28990242**  
**197 00 Toužimská 588/70**

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

**Rozpis ceny**

HSV	30 126,78
PSV	18 468,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 543,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	50 137,78 CZK
Základní DPH	21 %	10 529,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,22 CZK

**Cena celkem: 60 667,00 CZK**

**RAVION**

IČO: 289 90 242 DIČ: CZ 289 90 242  
 Praha 988/70 197 00 Praha 9, Kbely  
 e-mail: ravnio@ravion.cz

Za zhotovitele

v PRAZE

dne 26.07.2018

Popis: VI. Okapový chodník + omyvatelný nátěr v chodbě.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	32 964,30	27,56903
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-2 837,52	-2,36305
783	Nátěry	PSV	18 468,00	0,04464
VN	Vedlejší náklady	VN	1 543,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>50 137,78</b>	<b>25,25062</b>

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>32 964,30</b>
1	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	50,100	137,00	6 863,70
2	592-45601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	51,000	304,50	15 529,50
3	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	50,100	211,00	10 571,10
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-2 837,52</b>
4	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných mater.	m3	-6,756	420,00	-2 837,52
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>18 468,00</b>
5	783 83-2110.R00	Nátěr omítek stěn 1x + 2x email	m2	72,000	256,50	18 468,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 543,00</b>
6	1	Vedlejší náklady + přesuny hmot 3%	-	1,000	1 543,00	1 543,00
